Project:000 IKC APP LANGERAAR
Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop
Datum: 22-3-2023

000 IKC APP LANGERAAR
05 UITVOERINGSSCHEMA

VINK BOUW

Regel	Naam	Start	Eind	Duur
1	**Contract en gegevens**	**10-10-2023**	**22-4-2024**	**128d**
2	Aannemingsovk	10-10-2023	24-10-2023	14vd
3	Bouwvergunning ontherroepelijk	24-10-2023	24-10-2023	1d
4	NUTS tbv bouwvoorzieningen gereed	24-10-2023	24-10-2023	1d
5	Werktekeningen bouwkundig en constructief	24-10-2023	4-12-2023	30d
6	Maatgevende voorbereidingselement ruwbouw	31-10-2023	7-3-2024	83d
7	Maatgevende voorbereidingselement gevel	31-10-2023	22-4-2024	113d
8	**IKC de POEL**	**8-1-2024**	**20-12-2024**	**225d**
9	**Onderbouw**	**8-1-2024**	**7-3-2024**	**44d**
10	Inrichten bouwterrein	8-1-2024	18-1-2024	9d
11	Heiwerk	19-1-2024	1-2-2024	10d
12	Grondwerk tbv poeren, putten en balken	2-2-2024	8-2-2024	5d
13	Poeren, putten en balken inclusief kimmen	9-2-2024	22-2-2024	10d
14	Installaties onder BG aanbrengen	23-2-2024	29-2-2024	5d
15	BG vloer leggen	1-3-2024	7-3-2024	5d
16	Mobiele kraan	1-3-2024	18-10-2024	141d
17	Steiger	22-3-2024	18-10-2024	126d
18	**Ruwbouw**	**8-3-2024**	**22-4-2024**	**30d**
19	BG kz-wanden en stalen kolommen	8-3-2024	21-3-2024	10d
20	1e verdiepingsvloer staal en kanaalplaat	22-3-2024	28-3-2024	5d
21	1e verdieping kz-wanden en stalen kolommen	2-4-2024	15-4-2024	10d
22	2e verdiepingsvloer staal en kanaalplaat	16-4-2024	22-4-2024	5d
23	**Gevels en dak**	**23-4-2024**	**16-10-2024**	**104d**
24	HSB BG	23-4-2024	29-4-2024	5d
25	Metselwerk BG	30-4-2024	15-5-2024	10d
26	Steigerbouwen BG, 1e	16-5-2024	21-5-2024	3d
27	HSB 1e verdieping	22-5-2024	28-5-2024	5d
28	Metselwerk 1e	29-5-2024	11-6-2024	10d
29	Steigerbouwen 2e	12-6-2024	18-6-2024	5d
30	HSB 2e verdieping	19-6-2024	25-6-2024	5d
31	Metselwerk 2e	26-6-2024	9-7-2024	10d
32	Steigerbouwen 3e	10-7-2024	12-7-2024	3d
33	Verhoogde dakranden	15-7-2024	23-8-2024	10d
34	Metselwerk 3e	26-8-2024	6-9-2024	10d
35	Dakrekken inclusief veiligheid	15-7-2024	23-8-2024	10d
36	Isolatie en dakbedekking aanbrengen	26-8-2024	13-9-2024	15d
37	Opstanden en verhoogde dakranden	9-9-2024	25-9-2024	13d
38	Demonter steiger	26-9-2024	16-10-2024	10d
39	Hekwerken monteren	3-10-2024	9-10-2024	5d
40	Dakveiligheid-kanalen-zonnepanelen	16-9-2024	25-9-2024	8d
41	**Installaties**	**16-9-2024**	**27-11-2024**	**53d**
42	Lift	16-9-2024	16-10-2024	23d
43	Leidingwerk intern (meterkast-kabelgoot)	16-9-2024	16-10-2024	23d
44	NUTS invoeren	17-10-2024	6-11-2024	15d
45	Inregelen en stoken	7-11-2024	27-11-2024	15d
46	**Afbouw**	**4-7-2024**	**9-12-2024**	**93d**
47	Standleidingen aanbrengen	4-7-2024	22-8-2024	16d
48	KZ-steen binnenwanden 8won/wk	16-7-2024	3-9-2024	16d
49	Isolatie vloerverwarming	23-8-2024	13-9-2024	16d
50	Vloerverwarming	4-9-2024	25-9-2024	16d
51	Dekvloeren aanbrengen 1000m²/keer	16-9-2024	1-10-2024	8d
52	Afbouw MS-wanden- Plafonds wand en en vloerafwerk	20-9-2024	9-12-2024	54d
53	**Opleveren**	**10-12-2024**	**20-12-2024**	**9d**
54	Opleveren	10-12-2024	12-12-2024	3d
55	Naooien	13-12-2024	19-12-2024	5d
56	Sleuteloverdracht	20-12-2024	20-12-2024	1d
57	**APPARTEMENTEN**	**8-1-2024**	**11-2-2025**	**252d**
58	**ONDERBOUW**	**8-1-2024**	**7-3-2024**	**44d**
59	Inrichten bouwterrein	8-1-2024	18-1-2024	9d
60	Heiwerk	19-1-2024	1-2-2024	10d
61	Grondwerk tbv poeren, putten en balken	2-2-2024	8-2-2024	5d
62	Poeren, putten en balken inclusief kimmen	9-2-2024	22-2-2024	10d
63	Installaties onder BG aanbrengen	23-2-2024	29-2-2024	5d
64	BG vloer leggen	1-3-2024	7-3-2024	5d
65	Mobiele kraan	1-3-2024	18-10-2024	141d
66	Steiger	15-3-2024	18-10-2024	131d
67	**RUWBOUW**	**8-3-2024**	**27-6-2024**	**75d**
68	BG wanden	8-3-2024	14-3-2024	5d
69	1e verdiepingsvloer	15-3-2024	28-3-2024	10d
70	Steigerbouwen BG	15-3-2024	18-3-2024	2d
71	HSB BG	19-3-2024	20-3-2024	2d
72	1e verdieping wanden	2-4-2024	8-4-2024	5d
73	2e verdiepingsvloer	9-4-2024	22-4-2024	10d
74	Steigerbouwen 1e	9-4-2024	10-4-2024	2d
75	HSB 1e verdieping	11-4-2024	12-4-2024	2d
76	2e verdieping wanden	23-4-2024	29-4-2024	5d
77	3e verdiepingsvloer	30-4-2024	15-5-2024	10d
78	Steigerbouwen 2e	30-4-2024	1-5-2024	2d
79	HSB 2e verdieping	2-5-2024	3-5-2024	2d
80	3e verdieping wanden	16-5-2024	23-5-2024	5d
81	4e verdiepingsvloer	24-5-2024	6-6-2024	10d
82	Steigerbouwen 3e	24-5-2024	24-5-2024	1d
83	HSB 3e verdieping	27-5-2024	28-5-2024	2d
84	4e verdieping wanden	7-6-2024	13-6-2024	5d
85	Dakvloer	14-6-2024	27-6-2024	10d
86	Steigerbouwen 4e	14-6-2024	14-6-2024	1d
87	HSB 4e verdieping	17-6-2024	18-6-2024	2d
88	**Gevels en dak**	**28-6-2024**	**31-10-2024**	**70d**
89	Dakrekken inclusief veiligheid	28-6-2024	11-7-2024	10d
90	Isolatie en dakbedekking aanbrengen	12-7-2024	29-8-2024	15d
91	Dakveiligheid-kanalen-zonnepanelen	30-8-2024	10-9-2024	8d
92	Metselwerk BG	12-7-2024	21-8-2024	9d
93	Metselwerk 1e	22-8-2024	3-9-2024	9d
94	Metselwerk 2e	4-9-2024	16-9-2024	9d
95	Metselwerk 3e	17-9-2024	27-9-2024	9d
96	Metselwerk 4e	30-9-2024	10-10-2024	9d
97	Demonter steiger	11-10-2024	31-10-2024	10d
98	Hekwerken monteren	18-10-2024	24-10-2024	5d
99	**Installaties**	**30-8-2024**	**6-1-2025**	**82d**
100	Lift	30-8-2024	24-10-2024	40d
101	Leidingwerk intern (meterkast-kabelgoot)	30-8-2024	1-10-2024	23d
102	NUTS invoeren	1-11-2024	21-11-2024	15d
103	Inregelen en stoken	22-11-2024	6-1-2025	22d
104	**Afbouw**	**1-7-2024**	**13-1-2025**	**111d**
105	Standleidingen aanbrengen	1-7-2024	19-8-2024	16d
106	Isolatie vloerverwarming	11-7-2024	29-8-2024	16d
107	Vloerverwarming	20-8-2024	10-9-2024	16d
108	Dekvloeren aanbrengen	30-8-2024	16-9-2024	8d
109	Afbouw gibo - tegel en stucwerk etc 14wkn+4	5-9-2024	13-1-2025	80d
110	**Opleveren**	**14-1-2025**	**11-2-2025**	**21d**
111	Opleveren	14-1-2025	27-1-2025	10d
112	Naooien	28-1-2025	10-2-2025	10d
113	Sleuteloverdracht	11-2-2025	11-2-2025	1d

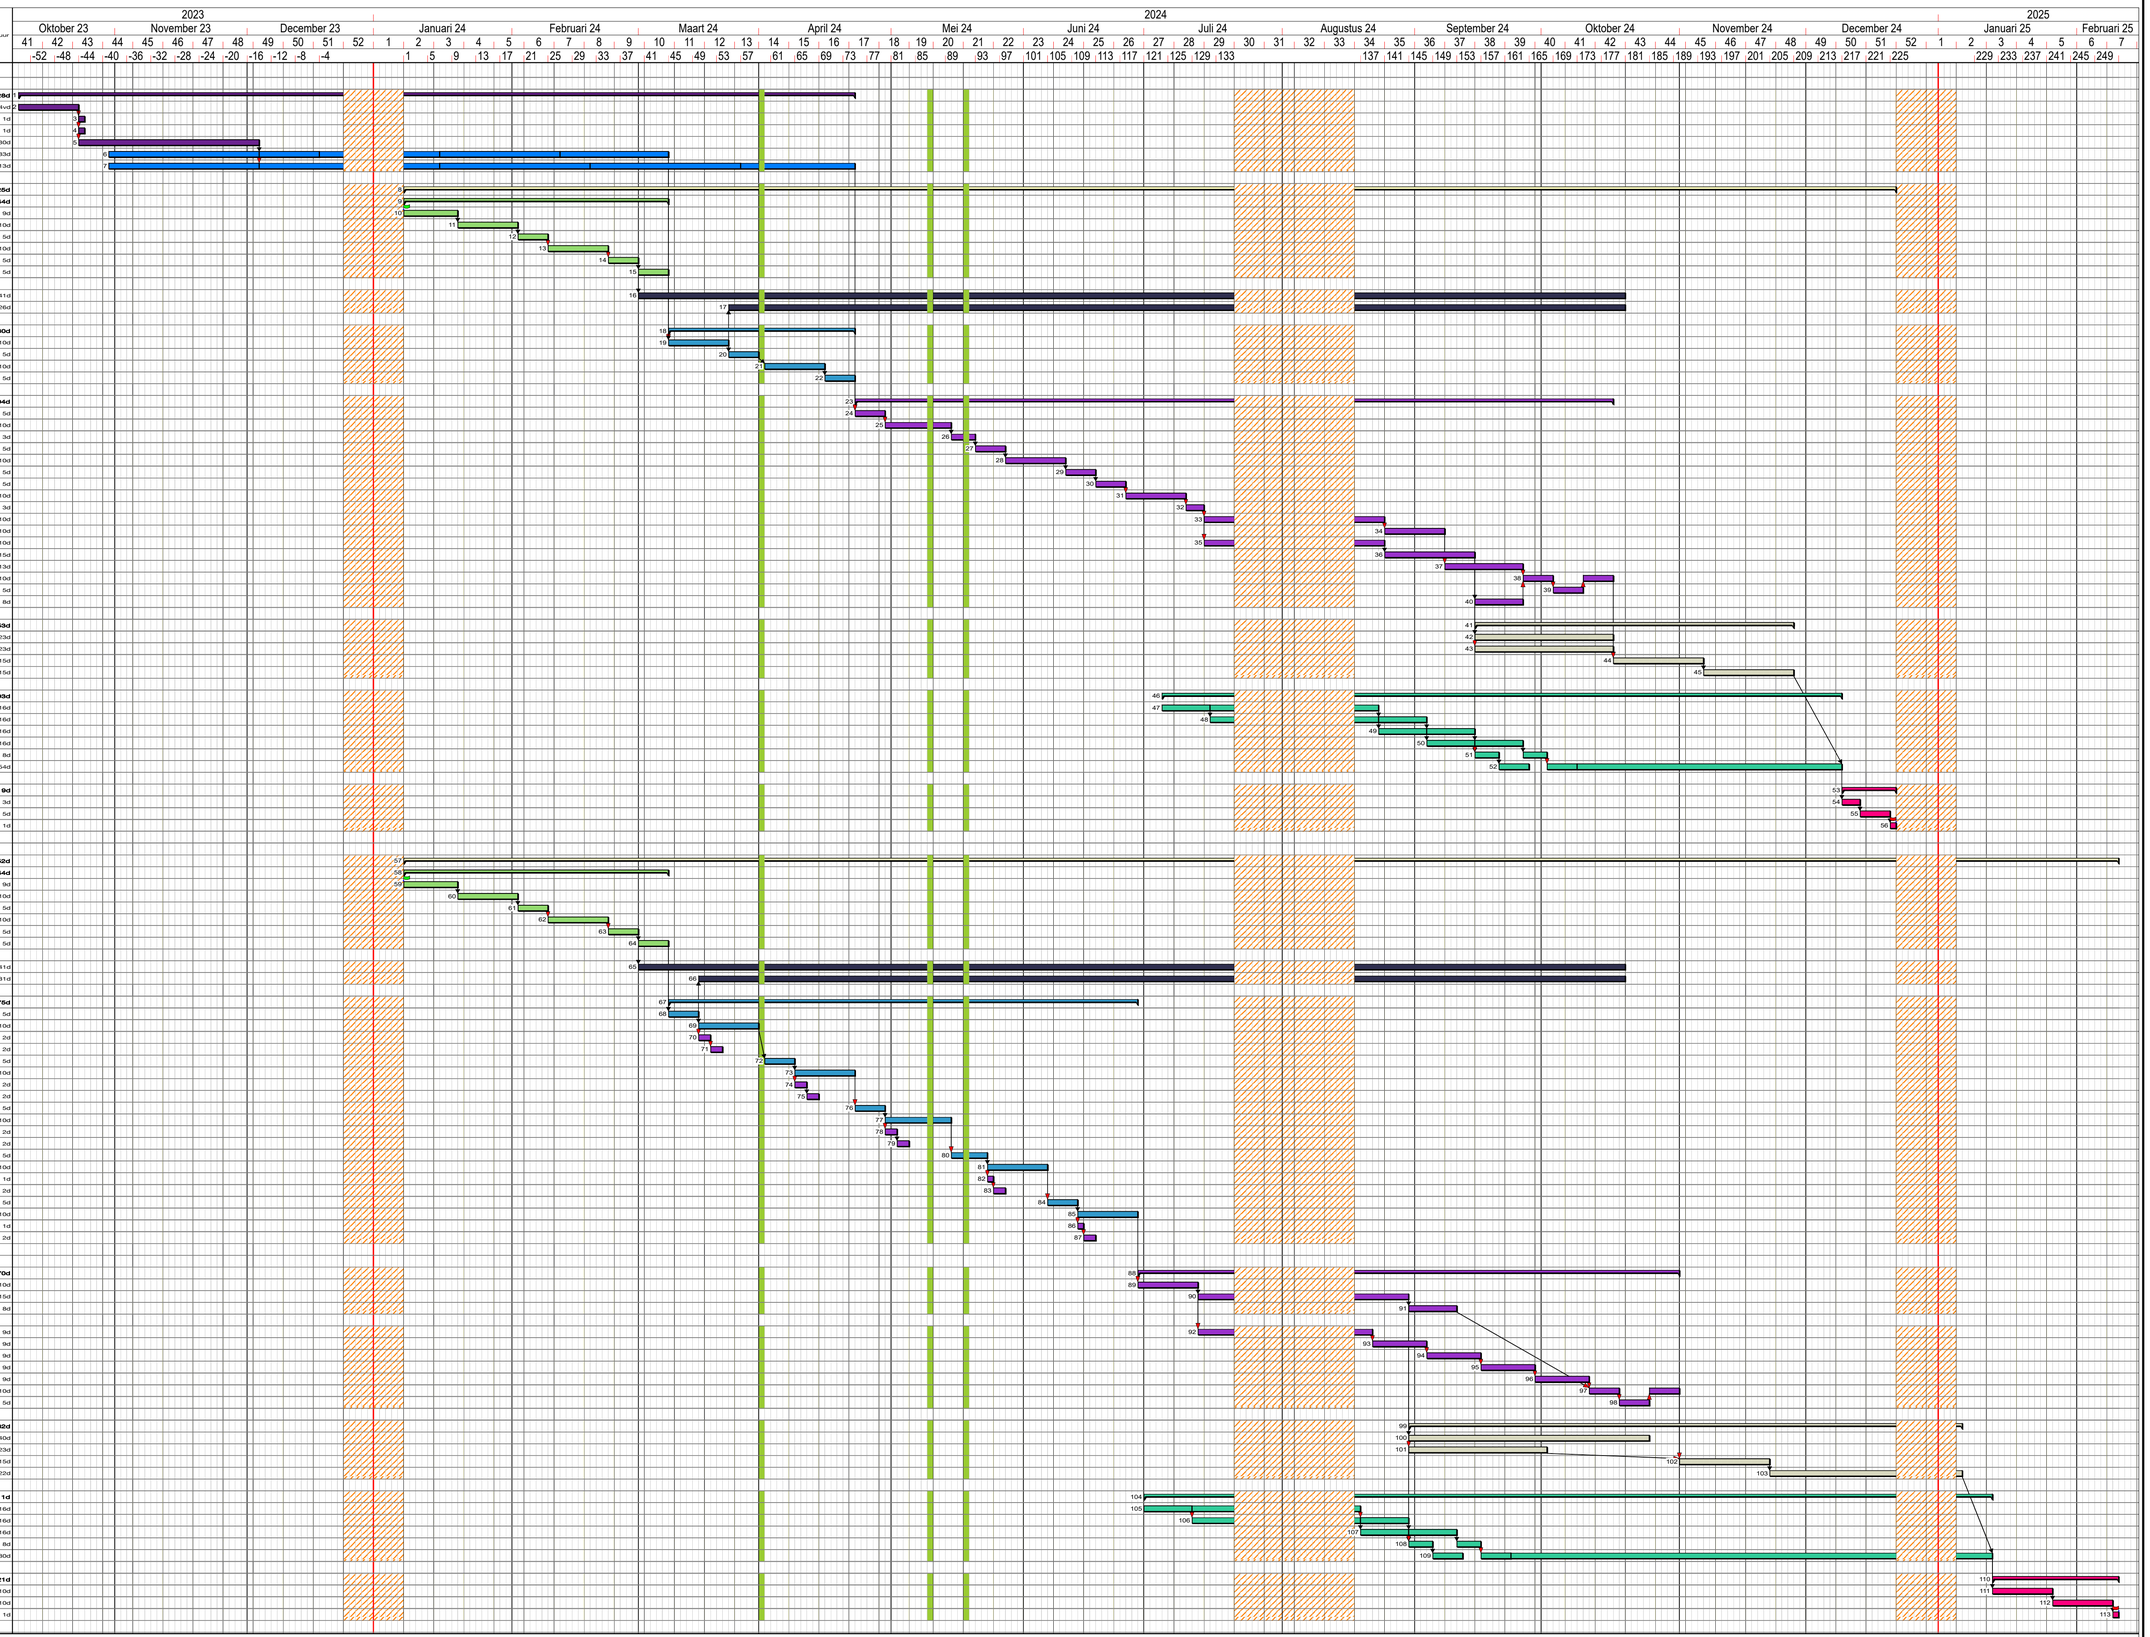

Rennoot: Opdrachtgever | Werkvoorbereider | Samenvatting | Ruwbouw onderbouw | Vink Bouw | Ruwbouw bovenbouw | Gevel en dak | Installaties | Afbouw | Opleveren
